


Proposta Comercial


A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
JUÍNA – MATO GROSSO,
TOMADA DE PREÇO 012/2018.

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e ciclovia no trecho de acesso ao IFMT – Campus Juína – Primeira Etapa, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.


INDICE DA DOCUMENTAÇÃO DE PREÇO

1. PROPOSTA DE PREÇO

1.1. Carta Proposta.....	01
1.2. Planilha de preços.....	02-08
1.3. Cronograma.....	09
1.4. BDI.....	10

2. TERMO DE ENCERRAMENTO	11
--------------------------------	----

Juína – MT, 18 de Janeiro de 2019.


Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli
CNPJ: 026.714.449/0001-05

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Tomada de Preço n.º 012/2018 – Juína/MT

Realização: 18/01/2019 às 08:00 horas

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e ciclovia no trecho de acesso ao IFMT – Campus Juína – Primeira Etapa, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.

Prezados Senhores,


Tendo examinado o Edital, nós, **Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli**, inscrita no CNPJ nº 26.714.449/0001-05, com sede na AV. das Arapongas, nº 82-N, Bairro Módulo 04, Juína - MT, abaixo-assinado, apresentamos a presente proposta para A EXECUÇÃO DA MENCIONADA OBRA estando incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de Preços de R\$ 1.444.739,40 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta Centavos) Depósito na Cooperativa Sicoob Integração, Agência nº 4425, Conta Corrente nº 8187-6, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais. O prazo de execução da Obra será de **90 dias** consecutivos.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.

Esclarecemos que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhistas e previdenciário incidente sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Juína – MT, 18 de Janeiro de 2019.


Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli
CNPJ: 026.714.449/0001-05




Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA		(1)CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)										
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.		(2)Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)										
		(3)DINTT/SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)										
Município:	JUÍNA / MT	BDI (Utilizado):		19,45%		(Serviços)		Encargos Sociais:		118,57%		
Local:	Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)	Extensão total:		1.620,00 m		Preço médio (R\$/m²) =				79,11		
Bairro:	Setor Industrial e Vicinal do IFMT	Área de Pavimento:		18.262,50 m²								
Data:	Marco/2018	Convênio: OGU SUDECO - SICONV: 842824/2017										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA												
ITEM	CÓDIGO SINAPI(1)	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		DIRETO		B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
1	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									70.177,56
1.1	Composição Auxiliar nº 001(2)	58.750,58	Administração local da obra através de serviços técnicos e de controle tecnológico.	und.	1,00	58.750,58	11.426,98				70.177,56	70.177,56
2	-	-	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									12.168,22
2.1	Composição Auxiliar nº 002(2)	5.093,44	Mobilização de equipamentos para obra (limitado até 2,0% do valor de investimento Convênio/Obra).	und.	1,00	5.093,44	990,67			6.084,11		6.084,11
2.2	Composição Auxiliar nº 002(2)	5.093,44	Desmobilização de equipamentos para obra (limitado até 2,0% do valor de investimento Convênio/Obra).	und.	1,00	5.093,44	990,67			6.084,11		6.084,11
3	-	-	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS									16.416,02
3.1	74209/001	475,68	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (Proporção: 8Y x 5Y = 3,20m x 2,00m - 1,0 unidade).	m²	6,40	475,68	92,51			568,19		3.636,41
3.2	93584	394,59	Execução de depósito em canteiro de obras, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.	m²	24,00	394,59	76,74			471,33		11.311,92
3.3	41598	1.278,44	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste de madeira.	und	1,00	1.228,71	238,98			1.467,69		1.467,69
4	-	-	TERRAPLENAGEM									377.111,14
4.1	-	-	DO SUB-LEITO DAS VIAS									13.973,15
4.1.1	79473	5,11	Corte e aterro compensado (volume de corte de subleito compensado em aterro p/ elevação do greide).	m³	405,505	5,11	0,99			6,10		2.473,58
4.1.2	79472	0,48	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora.	m²	20.174,70	0,48	0,09			0,57		11.499,57
4.2	-	-	ATERRO									136.821,00
4.2.1	73903/001	0,33	Limpeza superficial da camada vegetal em jazida (Caixa de Empréstimo).	m²	2.000,00	0,33	0,06			0,39		780,00

P. M. JUÍNA

02

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA			TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)			Encargos Sociais: 118,57%			
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.			⁽²⁾ Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)						
Município: JUÍNA / MT			⁽³⁾ DNIT/SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)						
Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)			BDI (Utilizado): 19,45% (Serviços)						
Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT			Extensão total: 1.620,00 m			Preço médio (R\$/m²) = 79,11			
Data: Março/2018			Área de Pavimento: 18.262,50 m²						
Convênio: OGU SUDECO - SICONV: 842824/2017									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
4.2.2	74151/001	2,82	Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com lâmina, peso operacional de 13 T e pá carregadeira com 170 HP. (Material para Aterro, oriundo de Caixa de Empréstimo).	m³	10.163,693	2,82	0,54	3,36	34.150,00
4.2.3	74034/001	1,58	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras com 153 HP.	m³	12.704,616	1,58	0,30	1,88	23.884,67
4.2.4	41722	4,21	Compactação mecânica a 100% do Proctor Normal - Pavimentação urbana.	m³	10.163,693	4,21	0,81	5,02	51.021,73
4.2.5	93594	0,99	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em via urbana em leito natural (Material: Aterro/Caixa de Empréstimo - DMT média 1,25 km até os locais de intervenção).	t x km	22.868,309	0,99	0,19	1,18	26.984,60
4.3	-	-	DA JAZIDA						226.316,99
4.3.1	73903/001	0,33	Limpeza superficial da camada vegetal em jazida (Cascalheira - Material: Sub-base e Base).	m²	2.000,00	0,33	0,06	0,39	780,00
4.3.2	74151/001	2,82	Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com lâmina, peso operacional de 13 T e pá carregadeira com 170 HP. (Material para Sub-base e Base).	m³	8.069,880	2,82	0,54	3,36	27.114,79
4.3.3	95878	0,71	Transporte comercial com caminhão basculante 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Material: Jazida p/ Sub-base e Base - DMT média 3,9 km até os locais de intervenção).	t x km	56.650,557	0,71	0,13	0,84	47.586,46
4.3.4	93594	0,99	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em via urbana em leito natural (Material: Jazida p/ Sub-base e Base - DMT média 8,8 km até os locais de intervenção).	t x km	127.826,899	0,99	0,19	1,18	150.835,74
5	-	-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						377.061,31
5.1	96387	6,30	Execução e compactação de Base ou Sub Base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte de solo. (Sub-Base=20cm e Base=20cm).	m³	8.069,880	6,30	1,22	7,52	60.685,49

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA		TABELAS DE REFERÊNCIA:		(1)CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)		Encargos Sociais:		118,57%	
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.				(2) Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)					
Município: JUÍNA / MT				(3) DNIT/SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)					
Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)						BDI (Utilizado):		19,45% (Serviços)	
Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT						Extensão total:		1.620,00 m	
Data: Março/2018						Área de Pavimento:		18.262,50 m²	
								Preço médio (R\$/m²) = 79,11	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
5.2	Composição Auxiliar nº 003 ⁽²⁾ (96401)	3,89	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 (material betuminoso sem ICMS)	m²	18.262,50	3,89	0,75	4,64	84.738,00
5.3	Composição Auxiliar nº 004 ⁽²⁾ (97805)	5,87	Construção de pavimento com Tratamento Superficial Duplo - TSD, com emulsão RR-2C (material betuminoso sem ICMS).	m²	18.262,50	5,87	1,14	7,01	128.020,12
5.4	Composição Auxiliar nº 005 ⁽²⁾ (73760/001)	2,97	Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,70 à 1,5 l/m², distribuição de agregados de 5 a 15 kg/m² e compactação com rolo - com uso da emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação.	m²	18.262,50	2,97	0,57	3,54	64.649,25
5.5	83356	0,75	Transporte comercial de Brita (caminhão basculante 10 m³, DMT em via urbana pavimentada de 4,4km e não pavimentada de 6,6km para material de brita e pedrisco p/ TSD, Capa Selante, Meio-fio c/ sarjeta e Calçada - Pedreira Comercial Juína/MT).	m³ x km	8.465,423	0,75	0,14	0,89	7.534,22
5.6	93176	0,43	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superior a 100 km (Material Betuminoso: CM-30 e RR-2C - DMT=750,00 km - Cuiabá/Distrito Industrial à Juína/MT).	t x km	61.635,750	0,43	0,08	0,51	31.434,23
6	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						327.307,80
6.1	94267	32,77	Guia (Meio-Fio) e Sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, Guia com 13 cm de base e 22 cm de altura, Sarjeta com 30cm de base e 8,5cm de altura.	m	3.187,00	32,77	6,37	39,14	124.739,18
6.2	94990	523,44	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado (Largura: 1,50m - espessura: 6,0cm).	m³	285,780	523,44	101,80	625,24	178.681,08

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA			TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)			Encargos Sociais: 118,57%		
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.			⁽²⁾ Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)					
Município: JUÍNA / MT			⁽³⁾ DNIT/SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)					
Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)			BDI (Utilizado): 19,45% (Serviços)					
Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT			Extensão total: 1.620,00 m			Preço médio (R\$/m²) =		
Data: Março/2018			Área de Pavimento: 18.262,50 m²			79,11		
Convênio: OGU SUDECO - SICONV: 842824/2017								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA								
ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO
								TOTAL
6.3	94116	122,17	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50m, com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência (regularização da faixa de calçamento, compactação e aplicação de lastro de brita com espessura de 3,0cm).	m³	142,890	122,17	23,76	145,93
6.4	83693	3,19	Caiação em meio fio.	m²	796,75	3,19	0,62	3,81
7	-	-	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					111.215,58
7.1	-	-	HORIZONTAL					93.611,19
7.1.1	72947	27,25	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro (Pintura de Faixas, setas e letras p/ 2 anos).	m²	1.523,65	27,25	5,30	32,55
7.1.2	5213360 ⁽³⁾	16,14	Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação.	und	357,00	16,14	3,13	19,27
7.1.3	5213362 ⁽³⁾	39,29	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação.	und	750,00	39,29	7,64	46,93
7.1.4	Composição Auxiliar nº 006 ⁽²⁾	90,21	Piso tátil 25x25cm de concreto, tipo Alerta, cor Amarelo, assentado sobre argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	m²	18,00	90,21	17,54	107,75
7.2	-	-	VERTICAL					15.321,14
7.2.1	5213464 ⁽³⁾	242,83	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI.	und	11,00	242,83	47,23	290,06
7.2.2	5213440 ⁽³⁾	197,01	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI.	und	11,00	197,01	38,31	235,32
7.2.3	5213445 ⁽³⁾	402,59	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I e SI.	und	5,00	402,59	78,30	480,89
7.2.4	5213863 ⁽³⁾	246,12	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m.	und	11,00	246,12	47,87	293,99
7.2.5	5213851 ⁽³⁾	195,08	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m.	und	11,00	195,08	37,94	233,02
								2.563,22

P. M. JUÍNA
350
000

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA			TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado) ⁽²⁾ Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado) ⁽³⁾ DNIT/SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)			Encargos Sociais: 118,57%			
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.									
Município: JUÍNA / MT									
Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)			BDI (Utilizado): 19,45% (Serviços)						
Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT			Extensão total: 1.620,00 m			Preço médio (R\$/m²) =			
Data: Março/2018			Área de Pavimento: 18.262,50 m²			79,11			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA									
Convênio: OGU SUDECO - SICONV: 842824/2017									
ITEM	CÓDIGO	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
7.2.6	5213856 ⁽³⁾	224,43	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m.	und	5,00	224,43	43,65	268,08	1.340,40
7.3	-	-	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO						2.283,25
7.3.1	Composição Auxiliar nº 007 ⁽²⁾	382,30	Fornecimento e instalação de Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45x20cm (conjunto composto de 2 placas e poste em tubo de aço galvanizado d=2" - comp: 3,00m p/ fixação vertical).	cj	5,00	382,30	74,35	456,65	2.283,25
8	-	-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						153.281,77
8.1	90106	10,26	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira hidráulica (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 à 1,50m, em solo de 1a. categoria, em locais com baixo nível de interferência.	m³	107,840	10,26	1,99	12,25	1.321,04
8.2	90108	9,20	Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50m até 3,00m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira hidráulica (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 à 1,50m, em solo de 1a. categoria, em locais com baixo nível de interferência.	m³	744,000	9,20	1,78	10,98	8.169,12
8.3	93379	11,67	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira hidráulica (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 à 1,50m, profundidade até 1,50m, com solo (sem substituição) de 1a. categoria em locais com baixo nível de interferência.	m³	85,593	11,67	2,26	13,93	1.192,31
8.4	93381	6,34	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 à 1,50m, profundidade 1,50 à 3,00m), com solo (sem substituição) de 1a. categoria em locais com baixo nível de interferência.	m³	490,664	6,34	1,23	7,57	3.714,32

P. M. JUÍNA

03/03/2018

06

A blue rectangular stamp is located in the upper left corner of the page. The stamp contains the text "P. M. JUNA" in a bold, sans-serif font. Below this, the word "Fig." is printed. Overlaid on the stamp are handwritten elements: the number "552" in a large, cursive script, and a signature that appears to be "J. P. J." written in a similar cursive style. The stamp is partially obscured by the signature and the number.

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA			TABELAS DE REFERÊNCIA:			Encargos Sociais:			
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.			⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)			118,57%			
Município: JUÍNA / MT			⁽²⁾ Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)						
Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)			⁽³⁾ DNIT/SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)						
Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT			BDI (Utilizado):			19,45% (Serviços)			
Data: Março/2018			Extensão total:			Preço médio			
			Área de Pavimento:			(R\$/m²) =			
			Convênio: OGU SUDECO - SICONV: 842824/2017			79,11			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
8.14	83627	423,62	Tampão fofo articulado, classe B125, carga máxima 12,5 T, redondo, tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p/ chaminé/caixa areia/poço de visita, assentado com argamassa cimento/areia 1:4 - Fornecimento e assentamento.	und	4,00	423,62	82,39	506,01	2.024,04
8.15	83715	616,17	Chaminé para poço de visita em alvenaria, excludos tampão e anel.	m	4,00	616,17	119,84	736,01	2.944,04
8.16	2003648 ⁽³⁾	1.925,01	Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais.	und	1,00	1.925,01	374,41	2.299,42	2.299,42
8.17	83659	721,26	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado (BLS - Boca de Lobo Simples)	und	2,00	721,26	140,28	861,54	1.723,08
8.18	Composição Auxiliar nº 008 ⁽²⁾	1.402,91	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:2:8, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado (BLD - Boca de Lobo Dupla).	und	8,00	1.402,91	272,86	1.675,77	13.406,16
8.19	73856/004	1.754,27	Boca para bueiro simples tubular, diâmetro de 1,00m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material de reaterro, jazida e transporte.	und	1,00	1.754,27	341,20	2.095,47	2.095,47
8.20	83690	477,41	Dissipador de energia em pedra argamassada, espessura 6cm, inclusive materiais e colocação medido p/ volume de pedra argamassada.	m³	6,000	477,41	92,85	570,26	3.421,56
8.21	2003419 ⁽³⁾	587,04	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais.	m	3,00	587,04	114,17	701,21	2.103,63
TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$									1.444.739,40

P. M. JUÍNA
26.714.449/0001-05
MARCOS BODSTEIN VILLÇA
FILHO EIRELI - EPP
Av. das Arapongas, 82 N - Módulo 04
CEP 78320-000
MT

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Av. das Arapongas, nº 82-N, Bairro Módulo 04, Juína - MT - CEP: 78.320-000
Telefone: (66) 3566-1482 | e-mail: contato@mavillconstrutora.com.br

JUÍNA

1011

CEP 10350-900

Via das Arahongas, 25 N. - Rio de Janeiro

FILHO EIRELI - EPP

MARCOS BODSTEIN ALTA/PA

1. 50.714.443/0001-08

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MunicípioJUÍNA / MT

Viabilização de Recursos

Convênio: OGU SUDECO - SICONV: 842824/2017

TOTAL (R\$)	
TOTAL ACUMULADO (R\$)	
TOTAL GERAL (R\$)	



2

26.714.449/0001-05
MARCOS BODSTEIN VILLÇA
FILHO EIRELI - EPP
Av. das Araçongas, 82 N - Módulo 04
CEP 78320-000
JUA

170114

CEB 1230-001

VA 032 VLSHOUNSA 85 N - HONOLULU

FILHO EIRELI - EBB

MARCOZ BODSTEIN ALTAÇA

L 50.114.44010001-02



Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.
Município: JUÍNA / MT
Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)
Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT
Data: Março/2018

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE B.D.I.

(Benefícios e Despesas Indiretas)

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

<u>Tipo de obra:</u>	Construção de Rodovias e Ferrovias	<u>Obras que se enquadram no tipo escolhido:</u>	
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública:	Onerado	Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.	
19,45%	FORA DA FAIXA		
Parâmetro	%	Verificação	OBSERVAÇÕES
<u>Administração Central</u> Mín: 3,80% Máx: 4,67%	3,80%	OK	Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.
<u>Seguros e Garantias</u> Mín: 0,32% Máx: 0,74%	0,32%	OK	
<u>Riscos</u> Mín: 0,50% Máx: 0,97%	0,50%	OK	As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 4,5% no item impostos.
<u>Despesas Financeiras</u> Mín: 1,02% Máx: 1,21%	1,02%	OK	
<u>Lucro</u> Mín: 6,64% Máx: 8,69%	6,64%	OK	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$ Onde: AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros; R: taxa de riscos; G: taxa de garantias; DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro/remuneração; I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
<u>Impostos: PIS</u>	0,65%	OK	
<u>Impostos: COFINS</u>	3,00%	OK	
<u>Impostos: ISS (mun.)</u>	2,00%	OK	
<u>Regime de desoneração (4,5%)</u>	0,00%	OK	

Declaramos que a Alíquota do ISS do município é de 5,0%, com Base de Cálculo de 40%, obtendo o imposto praticado de 2,0%, conforme CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO LEI MUNICIPAL N.º 1.046, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2008.

26.714.449/0001-05

MARCOS BODSTEIN VILLAÇA

FILHO EIRELI - EPP

Av. das Arapongas, 82 N - Módulo 04

CEP 78320-000

JUÍNA

MT



100-45321

100-45321

100-45321

100-45321

100-45321

100-45321

100-45321


A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
JUÍNA – MATO GROSSO,
TOMADA DE PREÇO 012/2018.

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e ciclovia no trecho de acesso ao IFMT – Campus Juína – Primeira Etapa, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.

TERMO DE ENCERRAMENTO PROPOSTA COMERCIAL

01. Esta pasta de Proposta de Preços contém **11 (onze)** folhas rubricadas e numeradas sequencialmente, inclusa esta.

Juína – MT, 18 de Janeiro de 2019.



Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli
CNPJ: 026.714.449/0001-05



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO XIV

Tomada de Preços n.º 012/2018


**MODELO DE TERMO DE DESISTÊNCIA DO DIREITO
E DO PRAZO RECURSAL**

À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína – Mato Grosso.
Tomada de Preços n.º 012/2018:

**TERMO DE DESISTÊNCIA DO DIREITO E DO PRAZO
RECURSAL**


A Signatária MARCOS Bodstun Villaga Filho Eireli, CNPJ/MF 26.714.449/0001-05, neste ato representada pelo Sr. Marcos Bodstun Villaga Filho, RG n.º 14058480 e do CPF/MF n.º 026.360.401-29, residente e domiciliado no Município de Juína, Estado de MT, pelo presente Termo De Desistência Do Direito E Do Prazo Recursal, **RENUNCIA** ao direito de interposição de recursos contra a fase de habilitação ~~E/OU julgamento das propostas de preços~~, da Tomada de Preços n.º 012/2018, realizada pelo Poder Executivo do Município de Juína-MT, ficando desde já autorizado a consignação em Ata do constante no presente Termo.

Local e data


Nome e assinatura da Licitante
Representante Legal

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVE SER ENTREGUE PELO TITULAR OU REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE, DEVIDAMENTE ASSINADO, AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CASO PRETENDA DESISTIR OU RENUNCIAR DO DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NO CERTAME.

Proposta Comercial


A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
JUÍNA – MATO GROSSO,
TOMADA DE PREÇO 012/2018.

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e ciclovias no trecho de acesso ao IFMT – Campus Juína – Primeira Etapa, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.


ÍNDICE DA DOCUMENTAÇÃO DE PREÇO

1. PROPOSTA DE PREÇO

1.1. Carta Proposta.....	01
1.2. Planilha de preços.....	02-08
1.3. Cronograma.....	09
1.4. BDI.....	10

2. TERMO DE ENCERRAMENTO	11
--------------------------------	----

Juína – MT, 18 de Janeiro de 2019.


Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli
CNPJ: 026.714.449/0001-05

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Tomada de Preço n.º 012/2018 – Juína/MT

Realização: 18/01/2019 às 08:00 horas

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e ciclovia no trecho de acesso ao IFMT – Campus Juína – Primeira Etapa, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.

Prezados Senhores,


Tendo examinado o Edital, nós, **Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli**, inscrita no CNPJ nº 26.714.449/0001-05, com sede na AV. das Arapongas, nº 82-N, Bairro Módulo 04, Juína - MT, abaixo-assinado, apresentamos a presente proposta para A EXECUÇÃO DA MENCIONADA OBRA estando incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de Preços de R\$ 1.444.739,40 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta Centavos) Depósito na Cooperativa Sicoob Integração, Agência nº 4425, Conta Corrente nº 8187-6, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais. O prazo de execução da Obra será de **90 dias** consecutivos.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.

Esclarecemos que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhistas e previdenciário incidente sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Juína – MT, 18 de Janeiro de 2019.


Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli
CNPJ: 026.714.449/0001-05



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA		TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)									
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.		⁽²⁾ Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)									
Município: JUÍNA / MT		⁽³⁾ DNT/ SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)									
Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)		BDI (Utilizado):		19,45%		(Serviços)		Encargos Sociais:		118,57%	
Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT		Extensão total:		1.620,00 m		Preço médio (R\$/m²) =		79,11			
Data: Março/2018		Área de Pavimento:		18.262,50 m²							
Convênio: OGU SUDECO - SICONV: 842824/2017											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA											
ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)			
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL		
1	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							70.177,56	
1.1	Composição Auxiliar nº 001 ⁽²⁾	58.750,58	Administração local da obra através de serviços técnicos e de controle tecnológico.	und.	1,00	58.750,58	11.426,98	70.177,56		70.177,56	
2	-	-	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							12.168,22	
2.1	Composição Auxiliar nº 002 ⁽²⁾	5.093,44	Mobilização de equipamentos para obra (limitado até 2,0% do valor de investimento Convênio/Obra).	und.	1,00	5.093,44	990,67	6.084,11		6.084,11	
2.2	Composição Auxiliar nº 002 ⁽²⁾	5.093,44	Desmobilização de equipamentos para obra (limitado até 2,0% do valor de investimento Convênio/Obra).	und.	1,00	5.093,44	990,67	6.084,11		6.084,11	
3	-	-	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS							16.416,02	
3.1	74209/001	475,68	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (Proporção: 8Y x 5Y = 3,20m x 2,00m - 1,0 unidade).	m²	6,40	475,68	92,51	568,19		3.636,41	
3.2	93584	394,59	Execução de depósito em canteiro de obras, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.	m²	24,00	394,59	76,74	471,33		11.311,92	
3.3	41598	1.278,44	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste de madeira.	und	1,00	1.228,71	238,98	1.467,69		1.467,69	
4	-	-	TERRAPLENAGEM							377.111,14	
4.1	-	-	DO SUB-LEITO DAS VIAS							13.973,15	
4.1.1	79473	5,11	Corte e aterro compensado (volume de corte de subleito compensado em aterro p/ elevação do greide).	m³	405,505	5,11	0,99	6,10		2.473,58	
4.1.2	79472	0,48	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora.	m²	20.174,70	0,48	0,09	0,57		11.499,57	
4.2	-	-	ATERRO							136.821,00	
4.2.1	73903/001	0,33	Limpeza superficial da camada vegetal em jazida (Caixa de Empréstimo).	m²	2.000,00	0,33	0,06	0,39		780,00	

P. M. JUÍNA
347

MAVILL
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA			TABELAS DE REFERÊNCIA:					(1)CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)			
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.								(2)Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)			
Município: JUÍNA / MT								(3)DNIT/SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)			
Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)			BDI (Utilizado):		19,45%		(Serviços)		Encargos Sociais: 118,57%		
Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT			Extensão total:		1.620,00 m		Preço médio (R\$/m²) =		79,11		
Data: Março/2018			Área de Pavimento:		18.262,50 m²						
Convênio: OGU SUDECO - SI CONV.: 842824/2017											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA											
ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)			
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL		
4.2.2	74151/001	2,82	Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com lâmina, peso operacional de 13 T e pá carregadeira com 170 HP. (Material para Aterro, oriundo de Caixa de Empréstimo).	m³	10.163,693	2,82	0,54	3,36	34.150,00		
4.2.3	74034/001	1,58	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras com 153 HP.	m³	12.704,616	1,58	0,30	1,88	23.884,67		
4.2.4	41722	4,21	Compactação mecânica a 100% do Proctor Normal - Pavimentação urbana.	m³	10.163,693	4,21	0,81	5,02	51.021,73		
4.2.5	93594	0,99	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em via urbana em leito natural (Material: Aterro/Caixa de Empréstimo - DMT média 1,25 km até os locais de intervenção).	t x km	22.868,309	0,99	0,19	1,18	26.984,60		
4.3	-	-	DA JAZIDA						226.316,99		
4.3.1	73903/001	0,33	Limpeza superficial da camada vegetal em jazida (Cascalheira - Material: Sub-base e Base).	m²	2.000,00	0,33	0,06	0,39	780,00		
4.3.2	74151/001	2,82	Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com lâmina, peso operacional de 13 T e pá carregadeira com 170 HP. (Material para Sub-base e Base).	m³	8.069,880	2,82	0,54	3,36	27.114,79		
4.3.3	95878	0,71	Transporte comercial com caminhão basculante 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Material: Jazida p/ Sub-base e Base - DMT média 3,9 km até os locais de intervenção).	t x km	56.650,557	0,71	0,13	0,84	47.586,46		
4.3.4	93594	0,99	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em via urbana em leito natural (Material: Jazida p/ Sub-base e Base - DMT média 8,8 km até os locais de intervenção).	t x km	127.826,899	0,99	0,19	1,18	150.835,74		
5	-	-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						377.061,31		
5.1	96387	6,30	Execução e compactação de Base ou Sub Base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte de solo. (Sub-Base=20cm e Base=20cm).	m³	8.069,880	6,30	1,22	7,52	60.685,49		

548
P. M. JUÍNA

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA			TABELAS DE REFERÊNCIA: (1)CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado) (2)Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado) (3)DNIT/SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)			Encargos Sociais: 118,57%			
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.									
Município: JUÍNA / MT									
Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)			BDI (Utilizado): 19,45% (Serviços)			Preço médio (R\$/m²) = 79,11			
Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT									
Data: Março/2018			Convênio: OGU SUDECO - SICONV: 842824/2017						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
5.2	Composição Auxiliar nº 003 ⁽²⁾ (96401)	3,89	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 (material betuminoso sem ICMS)	m²	18.262,50	3,89	0,75	4,64	84.738,00
5.3	Composição Auxiliar nº 004 ⁽²⁾ (97805)	5,87	Construção de pavimento com Tratamento Superficial Duplo - TSD, com emulsão RR-2C (material betuminoso sem ICMS).	m²	18.262,50	5,87	1,14	7,01	128.020,12
5.4	Composição Auxiliar nº 005 ⁽²⁾ (73760/001)	2,97	Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,70 à 1,5 l/m², distribuição de agregados de 5 a 15 kg/m² e compactação com rolo - com uso da emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação.	m²	18.262,50	2,97	0,57	3,54	64.649,25
5.5	83356	0,75	Transporte comercial de Brita (caminhão basculante 10 m³, DMT em via urbana pavimentada de 4,4km e não pavimentada de 6,6km para material de brita e pedrisco p/ TSD, Capa Selante, Meio-fio c/ sarjeta e Calçada - Pedreira Comercial Juína/MT).	m³ x km	8.465,423	0,75	0,14	0,89	7.534,22
5.6	93176	0,43	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superior a 100 km (Material Betuminoso: CM-30 e RR-2C - DMT=750,00 km - Cuiabá/Distrito Industrial à Juína/MT).	t x km	61.635,750	0,43	0,08	0,51	31.434,23
6	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	327.307,80					
6.1	94267	32,77	Guia (Meio-Fio) e Sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, Guia com 13 cm de base e 22 cm de altura, Sarjeta com 30cm de base e 8,5cm de altura.	m	3.187,00	32,77	6,37	39,14	124.739,18
6.2	94990	523,44	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado (Largura: 1,50m - espessura: 6,0cm).	m³	285,780	523,44	101,80	625,24	178.681,08

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA			TABELAS DE REFERÊNCIA:				(1)CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)	
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.			(2)Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)					
Município: JUÍNA / MT			(3)DNIT/SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)					
Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)			BDI (Utilizado):		19,45% (Serviços)		Encargos Sociais: 118,57%	
Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT			Extensão total:		1.620,00 m		Preço médio	
Data: Março/2018			Área de Pavimento:		18.262,50 m²		(R\$/m²) = 79,11	
Convênio: OGU SUDECO - SICONV: 842824/2017								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA								
ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO TOTAL
6.3	94116	122,17	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50m, com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência (regularização da faixa de calçamento, compactação e aplicação de lastro de brita com espessura de 3,0cm).	m³	142,890	122,17	23,76	145,93 20.851,93
6.4	83693	3,19	Calção em meio fio.	m²	796,75	3,19	0,62	3,81 3.035,61
7	-	-	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					111.215,58
7.1	-	-	HORIZONTAL					93.611,19
7.1.1	72947	27,25	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro (Pintura de Faixas, setas e letras p/ 2 anos).	m²	1.523,65	27,25	5,30	32,55 49.594,80
7.1.2	5213360 ⁽³⁾	16,14	Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação.	und	357,00	16,14	3,13	19,27 6.879,39
7.1.3	5213362 ⁽³⁾	39,29	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação.	und	750,00	39,29	7,64	46,93 35.197,50
7.1.4	Composição Auxiliar nº 006 ⁽²⁾	90,21	Piso tátil 25x25cm de concreto, tipo Alerta, cor Amarelo, assentado sobre argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	m²	18,00	90,21	17,54	107,75 1.939,50
7.2	-	-	VERTICAL					15.321,14
7.2.1	5213464 ⁽³⁾	242,83	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI.	und	11,00	242,83	47,23	290,06 3.190,66
7.2.2	5213440 ⁽³⁾	197,01	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI.	und	11,00	197,01	38,31	235,32 2.588,52
7.2.3	5213445 ⁽³⁾	402,59	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I e SI.	und	5,00	402,59	78,30	480,89 2.404,45
7.2.4	5213863 ⁽³⁾	246,12	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m.	und	11,00	246,12	47,87	293,99 3.233,89
7.2.5	5213851 ⁽³⁾	195,08	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m.	und	11,00	195,08	37,94	233,02 2.563,22

P. M. JUÍNA
350
350

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA			TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)			Encargos Sociais: 118,57%			
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.			⁽²⁾ Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)						
Município: JUÍNA / MT			⁽³⁾ DNIT/SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)						
Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)			BDI (Utilizado): 19,45% (Serviços)						
Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT			Extensão total: 1.620,00 m			Preço médio (R\$/m²) =			
Data: Março/2018			Área de Pavimento: 18.262,50 m²			79,11			
Convênio: OGU SUDECO - SICONV: 842824/2017									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
7.2.6	5213856 ⁽³⁾	224,43	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m.	und	5,00	224,43	43,65	268,08	1.340,40
7.3	-	-	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO						2.283,25
7.3.1	Composição Auxiliar n° 007 ⁽²⁾	382,30	Fornecimento e instalação de Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45x20cm (conjunto composto de 2 placas e poste em tubo de aço galvanizado d=2" - comp: 3,00m p/ fixação vertical).	cj	5,00	382,30	74,35	456,65	2.283,25
8	-	-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						153.281,77
8.1	90106	10,26	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira hidráulica (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 à 1,50m, em solo de 1a. categoria, em locais com baixo nível de interferência.	m³	107,840	10,26	1,99	12,25	1.321,04
8.2	90108	9,20	Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50m até 3,00m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira hidráulica (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 à 1,50m, em solo de 1a. categoria, em locais com baixo nível de interferência.	m³	744,000	9,20	1,78	10,98	8.169,12
8.3	93379	11,67	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira hidráulica (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 à 1,50m, profundidade até 1,50m, com solo (sem substituição) de 1a. categoria em locais com baixo nível de interferência.	m³	85,593	11,67	2,26	13,93	1.192,31
8.4	93381	6,34	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 à 1,50m, profundidade 1,50 à 3,00m), com solo (sem substituição) de 1a. categoria em locais com baixo nível de interferência.	m³	490,664	6,34	1,23	7,57	3.714,32

P. M. JUÍNA
FE.
18

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA				TABELAS DE REFERÊNCIA: (1)CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado) (2)Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado) (3)DNIT/SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)									
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.													
Município: JUÍNA / MT													
Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)													
Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT				BDI (Utilizado): 19,45% (Serviços) Encargos Sociais: 118,57%									
Data: Março/2018				Convênio: OGU SUDECO - SICONV: 842824/2017									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA													
ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)					
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL				
8.5	92210	84,79	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e assentamento.	m	76,00	84,79	16,49	101,28	7.697,28				
8.6	92212	137,25	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e assentamento.	m	18,00	137,25	26,69	163,94	2.950,92				
8.7	92214	205,17	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e assentamento.	m	100,00	205,17	39,90	245,07	24.507,00				
8.8	92216	276,85	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e assentamento.	m	160,00	276,85	53,84	330,69	52.910,40				
8.9	72840	0,57	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada (Material: tubo de concreto - DMT de até 10km, dentro do perímetro urbano do município de Juína/MT).	t x km	2.406,00	0,57	0,11	0,68	1.636,08				
8.10	94045	10,52	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 à 3,0m, largura menos que 1,50m, em local com nível baixo de interferência.	m²	130,00	10,52	2,04	12,56	1.632,80				
8.11	94097	4,69	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50m, em local com nível baixo de interferência.	m²	438,80	4,69	0,91	5,60	2.457,28				
8.12	74124/004	2.748,68	Poço de Visita para águas pluviais, em concreto armado 1,30x1,30x1,40m, coletor D=80cm, parede e=15cm, base de concreto Fck=10MPa, revestimento com argamassa de cimento/areia 1:4, inclusive fornecimento de todos materiais.	und	2,00	2.748,68	534,61	3.283,29	6.566,58				
8.13	74124/006	3.561,85	Poço de Visita para águas pluviais, em concreto armado 1,50x1,50x1,60m, coletor D=100cm, parede e=15cm, base de concreto Fck=10MPa, revestimento com argamassa de cimento/areia 1:4, inclusive fornecimento de todos materiais.	und	2,00	3.561,85	692,77	4.254,62	8.509,24				

P. M. JUÍNA
Fig. 552
Rb.

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA			TABELAS DE REFERÊNCIA: (1)CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado) (2)Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado) (3)DNIT/SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)			Encargos Sociais: 118,57%				
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.										
Município: JUÍNA / MT										
Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)										
Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT			BDI (Utilizado): 19,45% (Serviços)							
Data: Março/2018			Convênio: OGU SUDECO - SICONV: 842824/2017			Extensão total: 1.620,00 m Área de Pavimento: 18.262,50 m²			Preço médio (R\$/m²) = 79,11	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA										
ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)		
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL	
8.14	83627	423,62	Tampão fofo articulado, classe B125, carga máxima 12,5 T, redondo, tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p/ chaminé/caixa areia/poço de visita, assentado com argamassa cimento/areia 1:4 - Fornecimento e assentamento.	und	4,00	423,62	82,39	506,01	2.024,04	
8.15	83715	616,17	Chaminé para poço de visita em alvenaria, exclusivos tampão e anel.	m	4,00	616,17	119,84	736,01	2.944,04	
8.16	2003648 ⁽³⁾	1.925,01	Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais.	und	1,00	1.925,01	374,41	2.299,42	2.299,42	
8.17	83659	721,26	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado (BLS - Boca de Lobo Simples)	und	2,00	721,26	140,28	861,54	1.723,08	
8.18	Composição Auxiliar nº 008 ⁽²⁾	1.402,91	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:2:8, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado (BLD - Boca de Lobo Dupla).	und	8,00	1.402,91	272,86	1.675,77	13.406,16	
8.19	73856/004	1.754,27	Boca para bueiro simples tubular, diâmetro de 1,00m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material de reaterro, jazida e transporte.	und	1,00	1.754,27	341,20	2.095,47	2.095,47	
8.20	83690	477,41	Dissipador de energia em pedra argamassada, espessura 6cm, inclusive materiais e colocação medido p/ volume de pedra argamassada.	m³	6,000	477,41	92,85	570,26	3.421,56	
8.21	2003419 ⁽³⁾	587,04	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais.	m	3,00	587,04	114,17	701,21	2.103,63	
TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$								1.444.739,40		

[Assinatura]

26.714.449/0001-05
MARCOS BODSTEIN VILLAGA
FILHO EIRELI - EPP
 Av. das Arapongas, 82 N - Módulo 04
 CEP 78320-000
JUÍNA
 MT

MAVILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
 Av. das Arapongas, nº 82-N, Bairro Módulo 04, Juína - MT - CEP: 78.320-000
 Telefone: (66) 3566-1482 | e-mail: contato@mavillconstrutora.com.br

1011

CEB 10350-006

VIA: Rua Vitorino, 35 N - 200-000 - RJ

FILHO EIRELI - EPP

MARCOS RODRIGUES ALTAIR

L 36.714.443/0001-02

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
 Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.
 Município: JUÍNA / MT
 Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correia da Costa - E.46 à E.124)
 Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT
 Data: Março/2018

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Cronograma	Programa	Desenvolvimento	Regional	Modalidade	Empreendimento	
					Pavimentação e Drenagem da Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína	Valor do Projeto
☒ Global	☐ Individual	Agente	Promotor	Infraestrutura Urbana	Valor do Investimento	Valor da Obra
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL / SUDECO	1.500.000,00	1.500.000,00
Localização				Município		
Setor Industrial e Vicinal do IFMT				JUÍNA / MT		

Viabilização de Recursos															
Convênio: OGU SUDECO - SICONV: 842824/2017															
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.															
Tipo de Serviço															
Item	Discriminação dos serviços	Peso %	Valor R\$	30 Dias			60 Dias			90 Dias			120 Dias		
				Proponente	Concedente	%	Proponente	Concedente	%	Proponente	Concedente	%	Proponente	Concedente	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,85	70.177,56	R\$ 1.136,61	R\$ 12.898,90	20%	R\$ 2.273,22	R\$ 25.797,80	40%	R\$ 2.273,22	R\$ 25.797,80	40%	R\$ 2.273,22	R\$ 25.797,80	40%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,84	12.168,22	R\$ 492,70	R\$ 5.591,41	50%	R\$ -	R\$ -		R\$ 492,70	R\$ 5.591,42	50%	R\$ -	R\$ -	
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1,14	16.416,02	R\$ 1.329,39	R\$ 15.086,63	100%	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4	TERRAPLENAGEM	26,10	377.111,14	R\$ 7.634,71	R\$ 86.643,07	25%	R\$ 22.904,14	R\$ 259.929,22	75%	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	26,10	377.061,31	R\$ -	R\$ -		R\$ 30.534,82	R\$ 346.526,49	100%	R\$ -	R\$ -		R\$ 26.505,73	R\$ 300.802,07	100%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22,66	327.307,80	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.283,25	R\$ 108.932,33	100%	R\$ -	R\$ -	
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	7,70	111.215,58	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
8	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	10,60	153.281,77	R\$ 12.412,92	R\$ 140.868,85	100%	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL (R\$)				23.006,33	261.088,87	19,66	55.712,18	632.253,51	47,62	31.554,89	441.123,63	32,72	110.273,40	1.334.466,01	100,00
TOTAL ACUMULADO (R\$)				23.006,33	261.088,87	19,66	78.718,51	893.342,38	67,28						
TOTAL GERAL (R\$)					284.095,19	19,66		972.060,89	67,28						

MA VILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

26.714.449/0001-05

MARCOS BODSTEIN VILLAGA

FILHO EIRELI - EPP

Av. das Arapongas, 82 N - Módulo 04

CEP 78320-000

JUÍNA

Av. das Arapongas, nº 82-N, Bairro Módulo 04, Juína - MT - CEP: 78.320-000

Telefone: (66) 3566-1482 | e-mail: contato@mavillconstrutora.com.br

140111A

CEP 13320-000

Av. das Américas, 85 N. - Rio de Janeiro

FILHO EIRELI - EPP

MARCOS RODSTEIN AILLAC

150.114.440/0001-02

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.
Município: JUÍNA / MT
Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)
Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT
Data: Março/2018

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE B.D.I.

(Benefícios e Despesas Indiretas)

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

<u>Tipo de obra:</u>	Construção de Rodovias e Ferrovias	<u>Obras que se enquadram no tipo escolhido:</u>	
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública:	Onerado	Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.	
19,45%	FORA DA FAIXA		
Parâmetro	%	Verificação	OBSERVAÇÕES
<u>Administração Central</u> Mín: 3,80% Máx: 4,67%	3,80%	OK	Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.
<u>Seguros e Garantias</u> Mín: 0,32% Máx: 0,74%	0,32%	OK	
<u>Riscos</u> Mín: 0,50% Máx: 0,97%	0,50%	OK	As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 4,5% no item impostos.
<u>Despesas Financeiras</u> Mín: 1,02% Máx: 1,21%	1,02%	OK	
<u>Lucro</u> Mín: 6,64% Máx: 8,69%	6,64%	OK	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$ Onde: AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros; R: taxa de riscos; G: taxa de garantias; DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro/remuneração; I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
<u>Impostos: PIS</u>	0,65%	OK	
<u>Impostos: COFINS</u>	3,00%	OK	
<u>Impostos: ISS (mun.)</u>	2,00%	OK	
<u>Regime de desoneração (4,5%)</u>	0,00%	OK	

Declaramos que a Alíquota do ISS do município é de 5,0%, com Base de Cálculo de 40%, obtendo o imposto praticado de 2,0%, conforme CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO LEI MUNICIPAL N.º 1.046, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2008.

26.714.449/0001-05

MARCOS BODSTEIN VILLAGA

FILHO EIRELI - EPP

Av. das Araçongas, 82 N - Módulo 04

CEP 78320-000

JUÍNA

MT

ANILU

CEH 12750-000

ANILU - H 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

YIHO EIKETI - EBB

WABCO2 BOGSTEIN VITACU

20-10001044.417.02


A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
JUÍNA – MATO GROSSO,
TOMADA DE PREÇO 012/2018.

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e ciclovia no trecho de acesso ao IFMT – Campus Juína – Primeira Etapa, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.

TERMO DE ENCERRAMENTO PROPOSTA COMERCIAL

01. Esta pasta de Proposta de Preços contém **11 (onze)** folhas rubricadas e numeradas sequencialmente, inclusa esta.

Juína – MT, 18 de Janeiro de 2019.



Marcos Bodstein Villaça Filho Eireli
CNPJ: 026.714.449/0001-05



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO XIV

Tomada de Preços n.º 012/2018

**MODELO DE TERMO DE DESISTÊNCIA DO DIREITO
E DO PRAZO RECURSAL**

À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína – Mato Grosso.
Tomada de Preços n.º 012/2018:


**TERMO DE DESISTÊNCIA DO DIREITO E DO PRAZO
RECURSAL**

A Signatária MARCOS BODSTIM VILLAGO FILHO EIRLI, CNPJ/MF 26.714.449/0001-05, neste ato representada pelo Sr. Marcos Bodsttim Villago Filho, RG n.º 14058480 e do CPF/MF n.º 026.360.401-25, residente e domiciliado no Município de Juína, Estado de MT, pelo presente Termo De Desistência Do Direito E Do Prazo Recursal, **RENUNCIA** ao direito de interposição de recursos contra a fase de habilitação ~~E/OU julgamento das propostas de preços~~, da Tomada de Preços n.º 012/2018, realizada pelo Poder Executivo do Município de Juína-MT, ficando desde já autorizado a consignação em Ata do constante no presente Termo.

Local e data

Nome e assinatura da Licitante
Representante Legal

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVE SER ENTREGUE PELO TITULAR OU REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE, DEVIDAMENTE ASSINADO, AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CASO PRETENDA DESISTIR OU RENUNCIAR DO DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NO CERTAME.



À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína – Mato Grosso;
Tomada de Preços n.º 012/2018;
Data e Hora: 18/01/2019 às 08:00


OBJETO: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA NO TRECHO DE ACESSO AO IFMT – CAMPUS JUÍNA – PRIMEIRA ETAPA, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

DOCUMENTOS PARA PROPOSTA DE PREÇOS

1 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À PROPOSTA DE PREÇOS	02
1.1 – PROPOSTA DE PREÇOS	03
1.2 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	04-09
1.3 – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	10
1.4 – COMPOSIÇÃO DE BDI.....	11
1.5 – TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROPOSTA	12

Juína - MT, 18 de janeiro de 2019.


RCM COMERCIAL LTDA
CNPJ 04.216.351/0001-95
IVAN LUIS RIGODANZO
Representante Legal

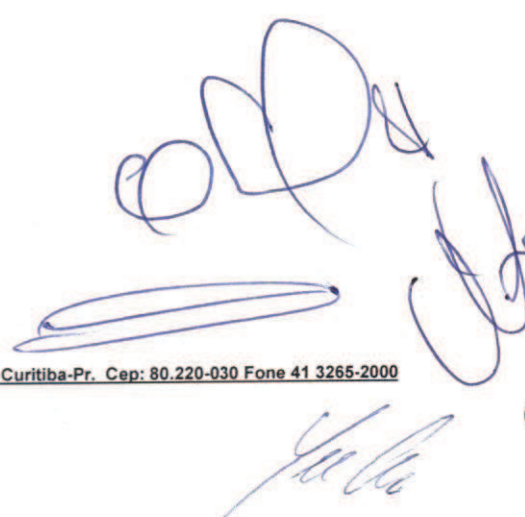



1 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À PROPOSTA DE PREÇOS



PROPOSTA DE PREÇOS

Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína – Mato Grosso;
Tomada de Preços n.º 012/2018;
Data e Hora: **18/01/2019 às 08:00**

OBJETO: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA NO TRECHO DE ACESSO AO IFMT – CAMPUS JUÍNA – PRIMEIRA ETAPA, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

Proposta que faz a empresa **RCM COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 04.216.351/0001-95 e inscrição estadual nº 90228516-48, estabelecida na Rua Desembargador Westphalen nº 1949, sala 12, Curitiba, Paraná, para atendimento do objeto destinado ao município de Juína/MT, em conformidade com o Edital Tomada de Preços n.º 012/2018, para tanto, oferecemos a esse órgão o preço para os itens indicados na Planilha Orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e composição de BDI.

Valor Total de **R\$ 1.350.362,78 (UM MILHÃO TREZENTOS E CINQUENTA MIL TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).**

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da proposta, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93.

Entregaremos os produtos/serviços conforme as exigências do Edital Tomada de Preços n.º 012/2018, bem como as demais condições.

Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais. O prazo previsto de execução é de 90 dias consecutivos.

Os dados da nossa empresa são:

Razão Social: **RCM COMERCIAL LTDA.**

CNPJ (MF) nº: 04.216.351/0001-95 Insc. Estadual nº: 9022851648

Endereço: Rua Desembargador Westphalen nº 1949, sala 12.

Cidade: Curitiba Estado: Paraná CEP: 80.202-030

a) Fone/Fax: 41 3265-2000 E-mail: **rcmcomercial@gmail.com** ou **ivanrigodanzo@hotmail.com**


b) Banco Bradesco: 237; Agência nº: 3286-7; Conta nº: 59432-6.

De acordo com a legislação em vigor, eu, **IVAN LUIS RIGODANZO**, CPF/MF nº 017.644.909-40, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro.

Juína – MT, 18 de Janeiro de 2019.



RCM COMERCIAL LTDA
CNPJ 04.216.351/0001-95
IVAN LUIS RIGODANZO
Representante Legal

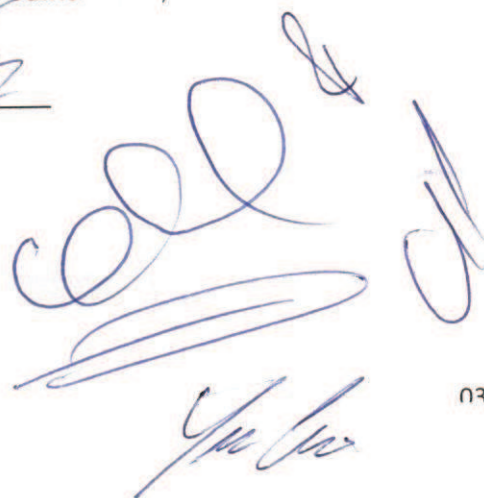



Proprietário:

RCM COMERCIAL LTDA



PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.

TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)
⁽²⁾Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)
⁽³⁾DNT/SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)Município: JUÍNA / MT
Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E-46 à E-124)
Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT
Data: 18/01/2019Extensão total: 1.620,00 m
Área de Pavimento: 18.262,50 m²
Encargos Sociais: 118,57%
Preço médio (R\$/m²) = 73,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
	SINAPI ⁽¹⁾					DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
1	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						65.581,50
1.1	Composição Auxiliar nº 001 ⁽²⁾	52.875,52	Administração local da obra através de serviços técnicos e de controle tecnológico.	und.	1,00	52.875,52	12.705,98	65.581,50	65.581,50
2	-	-	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						11.371,30
2.1	Composição Auxiliar nº 002 ⁽²⁾	4.584,10	Mobilização de equipamentos para obra (limitado até 2,0% do valor de investimento Convênio/Obra).	und.	1,00	4.584,10	1.101,55	5.685,65	5.685,65
2.2	Composição Auxiliar nº 002 ⁽²⁾	4.584,10	Desmobilização de equipamentos para obra (limitado até 2,0% do valor de investimento Convênio/Obra).	und.	1,00	4.584,10	1.101,55	5.685,65	5.685,65
3	-	-	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS						15.334,71
3.1	74209/001	428,11	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (Proporção: 8Y x 5Y = 3,20m x 2,00m - 1,0 unidade).	m ²	6,40	428,11	102,87	530,98	3.398,27
3.2	93584	355,13	Execução de depósito em canteiro de obras, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.	m ²	24,00	355,13	85,33	440,46	10.571,04
3.3	41598	1.150,60	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste de madeira.	und	1,00	1.100,87	264,53	1.365,40	1.365,40
4	-	-	TERRAPLENAGEM						352.563,78
4.1	-	-	DO SUB-LEITO DAS VIAS						12.999,91
4.1.1	79473	4,59	Corte e aterro compensado (volume de corte de subleito compensado em aterro p/ elevação do greide).	m ³	405,505	4,59	1,10	5,69	2.307,32
4.1.2	79472	0,43	Regularização de superfícies em terra com motorizadora.	m ²	20.174,70	0,43	0,10	0,53	10.692,59
4.2	-	-	ATERRO						128.040,23
4.2.1	73903/001	0,30	Limpeza superficial da camada vegetal em jazida (Caixa de Emprestimo).	m ²	2.000,00	0,30	0,07	0,37	740,00
4.2.2	74151/001	2,54	Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com lâmina, peso operacional de 13 T e pá carregadeira com 170 HP. (Material para Aterro, oriundo de Caixa de Emprestimo).	m ³	10.163,693	2,54	0,61	3,15	32.015,63
4.2.3	74034/001	1,42	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras com 153 HP.	m ³	12.704,616	1,42	0,34	1,76	22.360,12
4.2.4	41722	3,79	Compactação mecânica a 100% do Proctor Normal - Pavimentação urbana.	m ³	10.163,693	3,79	0,91	4,70	47.769,35



P. M. JUÍNA
Fig. 1

PropONENTE:



RCM COMERCIAL LTDA

Obra:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.

Município:

JUÍNA / MT

Local:

Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)

Bairro:

Sector Industrial e Vicinal do IFMT

Data:

18/01/2019

Convênio: OGU SUDECO - SICONV. 842824/2017

TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)

⁽²⁾Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)

⁽³⁾DNTT/SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)

BDI (Utilizado): 24,03% (Serviços) Encargos Sociais: 118,57%

Extensão total: 1.620,00 m Área de Pavimento: 18.262,50 m² Preço médio (R\$/m²) = 73,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
	SINAPI ⁽¹⁾					DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
4.2.5	93594	0,89	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em via urbana em leito natural (Material: Aterro/Calça de Empréstimo - DMT média 1,25 km até os locais de intervenção).	t x km	22.868,309	0,89	0,21	1,10	25.155,13
4.3	-	-	DA JAZIDA						211.523,64
4.3.1	73903/001	0,30	Limpeza superficial da camada vegetal em jazida (Cascalheira - Material: Sub-base e Base).	m²	2.000,00	0,30	0,07	0,37	740,00
4.3.2	74151/001	2,54	Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com lâmina, peso operacional de 13 T e pá carregadeira com 170 HP. (Material para Sub-base e Base).	m³	8.069,880	2,54	0,61	3,15	25.420,12
4.3.3	95878	0,64	Transporte comercial com caminhão basculante 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Material: Jazida p/ Sub-base e Base - DMT média 3,9 km até os locais de intervenção).	t x km	56.650,557	0,64	0,15	0,79	44.753,94
4.3.4	93594	0,89	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em via urbana em leito natural (Material: Jazida p/ Sub-base e Base - DMT média 8,8 km até os locais de intervenção).	t x km	127.826,899	0,89	0,21	1,10	140.609,58
5	-	-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						352.487,58
5.1	96387	5,67	Execução e compactação de Base ou Sub Base com solo estabilizado granulometricamente - exclusiva escavação, carga e transporte de solo. (Sub-Base=20cm e Base=20cm).	m³	8.069,880	5,67	1,36	7,03	56.731,25
5.2	Composição Auxiliar nº 003 ⁽²⁾ (96401)	3,50	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 (material betuminoso sem ICMS)	m²	18.262,50	3,50	0,84	4,34	79.259,25
5.3	Composição Auxiliar nº 004 ⁽²⁾ (97805)	5,28	Construção de pavimento com Tratamento Superficial Duplo - TSD, com emulsão RR-2C (material betuminoso sem ICMS).	m²	18.262,50	5,28	1,26	6,54	119.436,75
5.4	Composição Auxiliar nº 005 ⁽²⁾ (73760/001)	2,67	Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,70 à 1,5 l/m², distribuição de agregados de 5 a 15 kg/m² e compactação com rolo - com uso da emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação.	m²	18.262,50	2,67	0,64	3,31	60.448,87



P. M. JUINA
Fls. 569



Proponente:



RCM COMERCIAL LTDA

Obra:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.

Município:

JUÍNA / MT
Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)

Bairro:

Sector Industrial e Vicinal do IFMT

Data:

18/01/2019

Convênio: OGU SUDECO - SICONV. 842824/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA

TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)

⁽²⁾Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)

⁽³⁾DNTT/SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)

BDI (Utilizado): 24,03% (Serviços) Encargos Sociais: 118,57%

Extensão total: 1.620,00 m
Área de Pavimento: 18.262,50 m²
Preço médio (R\$/m²) = 73,94

ITEM	CÓDIGO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
	SINAPI ⁽¹⁾					DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
5.5	83356	0,67	Transporte comercial de Brita (caminhão basculante 10 m³, DMT em via urbana pavimentada de 4,4km e não pavimentada de 6,6km para material de brita e pedrisco p/ TSD, Capa Selante, Meio-fio c/ sarjeta e Calçada - Pedreira Comercial Juína/MT).	m³ x km	8.465,423	0,67	0,16	0,83	7.026,30
5.6	93176	0,39	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superior a 100 km (Material Betuminoso: CM-30 e RR-2C - DMT=750,00 km - Cuiabá/Distrito Industrial à Juína/MT).	t x km	61.635,750	0,39	0,09	0,48	29.585,16
6	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						305.876,07
6.1	94267	29,50	Guia (Meio-Fio) e Sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, Guia com 13 cm de base e 22 cm de altura, Sarjeta com 30cm de base e 8,5cm de altura.	m	3.187,00	29,50	7,08	36,58	116.580,46
6.2	94990	471,10	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado (Largura: 1,50m - espessura: 6,0cm).	m³	285,780	471,10	113,20	584,30	166.981,25
6.3	94116	109,95	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50m, com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência (regularização da faixa de calçamento, compactação e aplicação de lastro de brita com espessura de 3,0cm).	m³	142,890	109,95	26,42	136,37	19.485,90
6.4	83693	2,87	Caliação em meio fio.	m²	796,75	2,87	0,68	3,55	2.828,46
7	-	-	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						103.918,50
7.1	-	-	HORIZONTAL						87.467,25
7.1.1	72947	24,52	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microfresas de vidro (Pintura de Faixas, setas e letras p/ 2 anos).	m²	1.523,65	24,52	5,89	30,41	46.334,19
7.1.2	5213360 ⁽³⁾	14,53	Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação.	und	357,00	14,53	3,49	18,02	6.433,14
7.1.3	5213362 ⁽³⁾	35,36	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação.	und	750,00	35,36	8,49	43,85	32.887,50
7.1.4	Composição Auxiliar nº 006 ⁽²⁾	81,19	Piso tátil 25x25cm de concreto, tipo Alerta, cor Amarelo, assentado sobre argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	m²	18,00	81,19	19,50	100,69	1.812,42

RCM COMERCIAL LTDA

Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.

Município: JUÍNA / MT
Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)
Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT
Data: 18/01/2019

Convenio: OGU SUDECO - SICONV: 842824/2017

TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)

⁽²⁾Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)
⁽³⁾DNIT/SICRO/MT - SETEMBRO/2012 (Não Desonerado)

BDI (Utilizado): 24,03% (Serviços) Encargos Sociais: 118,57%

Extensão total: 1.620,00 m
Área de Pavimento: 18.262,50 m² Preço médio (R\$/m²) = 73,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
	SINAPI ⁽¹⁾					DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
7.2	-	-	VERTICAL						14.317,50
7.2.1	5213464 ⁽³⁾	218,55	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI.	und	11,00	218,55	52,51	271,06	2.981,66
7.2.2	5213440 ⁽³⁾	177,31	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI.	und	11,00	177,31	42,60	219,91	2.419,01
7.2.3	5213445 ⁽³⁾	362,33	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I e SI.	und	5,00	362,33	87,06	449,39	2.246,95
7.2.4	5213863 ⁽³⁾	221,51	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m.	und	11,00	221,51	53,22	274,73	3.022,03
7.2.5	5213851 ⁽³⁾	175,57	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m.	und	11,00	175,57	42,18	217,75	2.395,25
7.2.6	5213856 ⁽³⁾	201,99	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m.	und	5,00	201,99	48,53	250,52	1.252,60
7.3	-	-	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO						2.133,75
7.3.1	Composição Auxiliar nº 007 ⁽²⁾	344,07	Fornecimento e instalação de Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45x20cm (conjunto composto de 2 placas e poste em tubo de aço galvanizado d=2" - comp: 3,00m p/ fixação vertical).	cj	5,00	344,07	82,68	426,75	2.133,75
8	-	-	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						143.229,34
8.1	90106	9,23	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroscavadeira hidráulica (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 à 1,50m, em solo de 1a. categoria, em locais com baixo nível de interferência.	m³	107,840	9,23	2,21	11,44	1.233,68
8.2	90108	8,28	Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50m até 3,00m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroscavadeira hidráulica (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 à 1,50m, em solo de 1a. categoria, em locais com baixo nível de interferência.	m³	744,000	8,28	1,98	10,26	7.633,44

Proporiente:



RCM COMERCIAL LTDA

Obra:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.

Município:

JUÍNA / MT

Local:

Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)

Bairro:

Sector Industrial e Vicinal do IFMT

Data:

18/01/2019

Convênio: OGU SUDECO - SICONV. 842824/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
	SINAPI ⁽¹⁾					DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
8.3	93379	10,50	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira hidráulica (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 à 1,50m, profundidade até 1,50m, com solo (sem substituição) de 1a. categoria em locais com baixo nível de interferência.	m³	85,593	10,50	2,52	13,02	1.114,42
8.4	93381	5,71	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 à 1,50m, profundidade 1,50 à 3,00m, com solo (sem substituição) de 1a. categoria em locais com baixo nível de interferência.	m³	490,664	5,71	1,37	7,08	3.473,90
8.5	92210	76,31	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e assentamento.	m	76,00	76,31	18,33	94,64	7.192,64
8.6	92212	123,52	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e assentamento.	m	18,00	123,52	29,68	153,20	2.757,60
8.7	92214	184,65	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e assentamento.	m	100,00	184,65	44,37	229,02	22.902,00
8.8	92216	249,16	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e assentamento.	m	160,00	249,16	59,87	309,03	49.444,80
8.9	72840	0,51	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada (Material: tubo de concreto - DMT de até 10km, dentro do perímetro urbano do município de Juína/MT).	t x km	2.406,00	0,51	0,12	0,63	1.515,78
8.10	94045	9,47	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 à 3,0m, largura menos que 1,50m, em local com nível baixo de interferência.	m²	130,00	9,47	2,27	11,74	1.526,20
8.11	94097	4,22	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50m, em local com nível baixo de interferência.	m²	438,80	4,22	1,01	5,23	2.294,92
8.12	74124/004	2.473,81	Poco de Visia para águas pluviais, em concreto armado 1,30x1,30x1,40m, coletor D=80cm, parede e=15cm, base de concreto Fck=10MPa, revestimento com argamassa de cimento/areia 1:4, inclusive fornecimento de todos materiais.	und	2,00	2.473,81	594,45	3.068,26	6.136,52

TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)

⁽²⁾Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)

⁽³⁾DMT/SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)

BDI (Utilizado): 24,03% (Serviços) Encargos Sociais: 118,57%

Extensão total: 1.620,00 m Área de Pavimento: 18.262,50 m² Preço médio (R\$/m²) = 73,94

P. M. JUINA
Fls. 485

Proponente:



RCM COMERCIAL LTDA

Obra:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.

Município:

JUINA / MT

Local:

Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E-46 a E-124)

Bairro:

Sector Industrial e Vicinal do IFMT

Data:

18/01/2019

Convenio: OGU SUDECO - SICONV- 842824/2017

TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)

⁽²⁾Composição Auxiliar/MT - JANEIRO/2018 (Não Desonerado)
⁽³⁾DNT/SICRO/MT - SETEMBRO/2017 (Não Desonerado)

BDI (Utilizado):

24,03%

(Serviços)

Encargos Sociais:

118,57%

Extensão total:

1.620,00 m

Preço médio (R\$/m²) =

73,94

Área de Pavimento: 18.262,50 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
	SINAPI ⁽¹⁾					DIRETO	B.O.I.	UNITÁRIO	TOTAL
8.13	74124/006	3.205,66	Poço de Visita para águas pluviais, em concreto armado 1,50x1,50x1,60m, coletor D=100cm, parede e=15cm, base de concreto Fck=10MPa, revestimento com argamassa de cimento/areia 1:4, inclusive fornecimento de todos materiais.	und	2,00	3.205,66	770,32	3.975,98	7.951,96
8.14	83627	381,26	Tampão foto articulado, classe B125, carga máxima 12,5 T, redondo, tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p/ chaminé/caixa areia/poço de visita, assentado com argamassa cimento/areia 1:4 - Fornecimento e assentamento.	und	4,00	381,26	91,61	472,87	1.891,48
8.15	83715	554,55	Chaminé para poço de visita em alvenaria, exclusivos tampão e anel.	m	4,00	554,55	133,25	687,80	2.751,20
8.16	2003648 ⁽³⁾	1.732,51	Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais.	und	1,00	1.732,51	416,32	2.148,83	2.148,83
8.17	83659	649,13	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado (BLS - Boca de Lobo Simples)	und	2,00	649,13	155,98	805,11	1.610,22
8.18	Composição Auxiliar nº 008 ⁽²⁾	1.262,62	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:2:8, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado (BLD - Boca de Lobo Dupla).	und	8,00	1.262,62	303,40	1.566,02	12.528,16
8.19	73856/004	1.578,84	Boca para bueiro simples tubular, diâmetro de 1,00m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material de reaterro, jazida e transporte.	und	1,00	1.578,84	379,39	1.958,23	1.958,23
8.20	83690	429,67	Dissipador de energia em pedra argamassada, espessura 6cm, inclusive materiais e colocação medido p/ volume de pedra argamassada.	m³	6,000	429,67	103,24	532,91	3.197,46
8.21	2003419 ⁽³⁾	528,34	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais.	m	3,00	528,34	126,96	655,30	1.965,90

TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 1.350.362,78

VALOR POR EXTENSO: UM MILHÃO TREZENTOS E CINQUENTA MIL TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS.



P. M. JUINA
568
2026

Proprietário:



RCM COMERCIAL LTDA

Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.

Município: JUINA / MT

Local: Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)

Bairro: Setor Industrial e Vicinal do IFMT

Data: 18/01/2019

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Cronograma	Programa	Modalidade	Empreendimento
☒ Global	☐ Individual	Desenvolvimento Regional	Infraestrutura Urbana
Agente Financeiro	Agente Promotor	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL / SUDECO
Localização		Município	
Setor Industrial e Vicinal do IFMT		JUÍNA / MT	
Tipo de Serviço		Viabilização de Recursos	
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.		Convênio: OGU SUDECO - SICONV: 842824/2017	

Item	Discriminação dos serviços	Peso	Valor	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,85	65.581,50	R\$ 1.057,28	R\$ 2.114,55	R\$ 2.114,55	R\$ 2.114,55
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,84	11.371,30	R\$ 458,31	R\$ -	R\$ 458,31	R\$ 458,31
3	INSTALAÇÃO DO CANTIEIRO DE OBRAS	1,14	15.334,71	R\$ 1.236,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	TERRAPLENAGEM	26,11	352.563,78	R\$ 7.104,85	R\$ 21.314,55	R\$ 243.108,28	R\$ -
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	26,10	352.487,58	R\$ -	R\$ 28.413,26	R\$ 324.074,32	R\$ -
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22,65	305.876,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.656,01
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	7,70	103.918,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.133,75
8	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	10,60	143.229,34	R\$ 11.545,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL (R\$)		100	1.350.362,78	21.401,94	51.842,37	29.362,62	412.350,21
TOTAL ACUMULADO (R\$)			1.350.362,78	21.401,94	73.244,31	102.606,93	1.247.755,86
TOTAL GERAL (R\$)				265.506,94	19,66	67,29	100,00

RCM COMERCIAL LTDA
CNPJ 04.216.351/0001-95
IVAN LUIS RIGODANZO
RG 5.756.740/6 SSP/PR



Proponente:		RCM COMERCIAL LTDA
Obra:	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INFRAESTRUTURA URBANA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA.	
Município:	JUÍNA / MT	
Local:	Estrada de Acesso ao IFMT - Campus Juína - Primeira Etapa (Ligação com a Av. Gov. Fernando Correa da Costa - E.46 à E.124)	
Bairro:	Setor Industrial e Vicinal do IFMT	
REFERÊNCIA:	Março/2018	Convênio: OGU SUDECO - SICONV: 842824/2017
Composição da Parcela de BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)		
Itens relativos à Administração da Obra		%
AC - Administração Central		4,67%
DF - Despesas Financeiras		1,21%
R - Riscos		0,97%
S - Seguros e Garantias		0,74%
Sub-total		7,59%
Lucro		%
L - Lucro/Remuneração		8,69%
Sub-total		8,69%
T - Taxas e Impostos		%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
ISSQN		2,00%
Contribuição Previdenciária - Lei N°13161/2015		0,00%
Sub-total		5,65%
$BDI = \frac{(1 + AC + R + S) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L) - 1}{(1 - T)}$		
BDI=		24,03%
Obs: De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.		

Juína/MT, 18 de JANEIRO de 2019.


RCM COMERCIAL LTDA
CNPJ 04.216.351/0001-95
IVAN LUIS RIGODANZO
RG 5.756.740/6 SSP/PR



À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína – Mato Grosso;
Tomada de Preços n.º 012/2018;
Data e Hora: **18/01/2019 às 08:00**


OBJETO: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CICLOVIA NO TRECHO DE ACESSO AO IFMT – CAMPUS JUÍNA – PRIMEIRA ETAPA, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO.

TERMO DE ENCERAMENTO DE PROPOSTA

Encerra-se nesta página a documentação referente ao Envelope N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, encaminhada pela empresa **RCM COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) n° 04.216.351/0001-95 e inscrição estadual n° 90228516-48, estabelecida na Rua Desembargador Westphalen n° 1949, sala 12, Curitiba, Paraná, para atendimento do objeto destinado ao município de Juína/MT, em conformidade com o Edital Toma de Preços n.º 012/2018, completando um total de 07 (sete) páginas, esta incluída.


Juína - MT, 18 de Janeiro de 2019.


RCM COMERCIAL LTDA
CNPJ 04.216.351/0001-95
IVAN LUIS RIGODANZO
Representante Legal





MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO XIV

Tomada de Preços n.º 012/2018

**MODELO DE TERMO DE DESISTÊNCIA DO DIREITO
E DO PRAZO RECURSAL**


À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína – Mato Grosso.
Tomada de Preços n.º 012/2018:

**TERMO DE DESISTÊNCIA DO DIREITO E DO PRAZO
RECURSAL**

A Signatária RCM COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF
04.216.351/0001-95, neste ato representada pelo Sr.
IVAN LUIS RIGODANZO, RG n.º 5.756.740-6 e do CPF/MF n.º
017.644.903-40, residente e domiciliado no Município de
Juína, Estado de MT, pelo presente Termo De Desistência Do
Direito E Do Prazo Recursal, **RENUNCIA** ao direito de interposição de recursos
contra a fase de habilitação E/OU ~~juízo de julgamento das propostas de preços~~, da Tomada
de Preços n.º 012/2018, realizada pelo Poder Executivo do Município de Juína-MT,
ficando desde já autorizado a consignação em Ata do constante no presente Termo.

30/01/2019

Local e data


Nome e assinatura da Licitante
Representante Legal

**OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVE SER ENTREGUE PELO TITULAR OU REPRESENTANTE
LEGAL DO LICITANTE, DEVIDAMENTE ASSINADO, AO PRESIDENTE DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CASO PRETENDA DESISTIR OU RENUNCIAR DO DIREITO DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NO CERTAME.**
